BAGA BDT - horisontell markbädd - BDT 1-6 hh

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning:			
Kommun:			
Uppgifter ifyllda av:	☐ Entreprenör ☐ Fastighetsägare ☐ Konsult ☐ Annan	**Datum:**	
Kontaktperson:			
Ev. firmanamn:			
Telefon:			
Email:			


Anläggningens storlek

Alt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	**Egen dimensionering:**	☐
Antal hushåll:	1	2	3	4	5	6		
Antal PE:	5	10	15	20	25	30		
Flöde m³/dygn:	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6		
Våtvolym m³:	1,2	2,2	3,0	3,0	4,0	7,0		
Slamvolym m³:	0,5	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0		
Antal bioModulpaket:	1	2	3	3	4	5		
Bäddyta:	16,5	33	49,5	49,5	66	82,5		
Längd m:	5,5	11	8,25	8,25	11	13,75		
Bredd m:	3	3	6	6	6	6		

Anläggningsinformation


Mätning / Uppgift	**Värde / Svar**
Test av markens genomsläpplighet utfört genom: ☐ Perkolationstest i rör ☐ Perkolationstest i grop ☐ Siktanalys ☐ Okulärbesiktning	LTAR =
Provtagningsbrunn	☐ Ja ☐ Nej
Tätskikt (gummiduk)	☐ Ja ☐ Nej
Avskärande dränering	☐ Ja ☐ Nej (behövs ej)
Ventilation av slamavskiljaren möjlig enligt anvisning	☐ Över taknock ☐ Annan
Beskickning av bädd	☐ Pump ☐ Självfall
Anläggningen utförs enligt BAGAs dokumenterade anvisningar	☐ Ja ☐ Nej (Se övrig info.)
Övrig information:	

Bäddens uppbyggnad

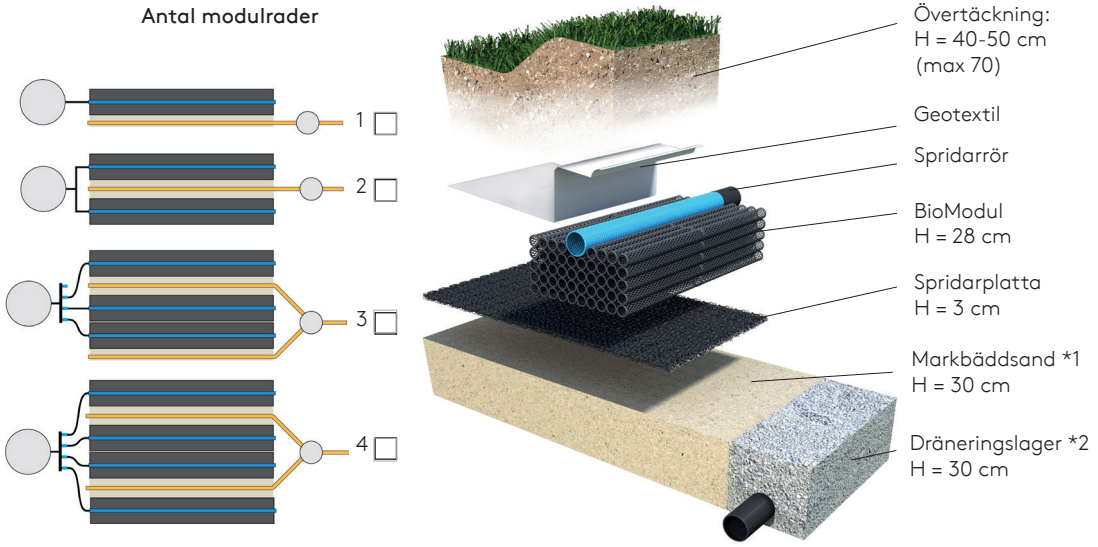


*1. LTAR 15-70 alternativt markbäddssand 0-8 mm enligt NVV AR 87:6.
*2. Fraktioner mellan 2-8 mm. Väljs så att sandlagret ej blandas med dräneringslagret.


Anläggningens mått (Se vidare nästa sida)

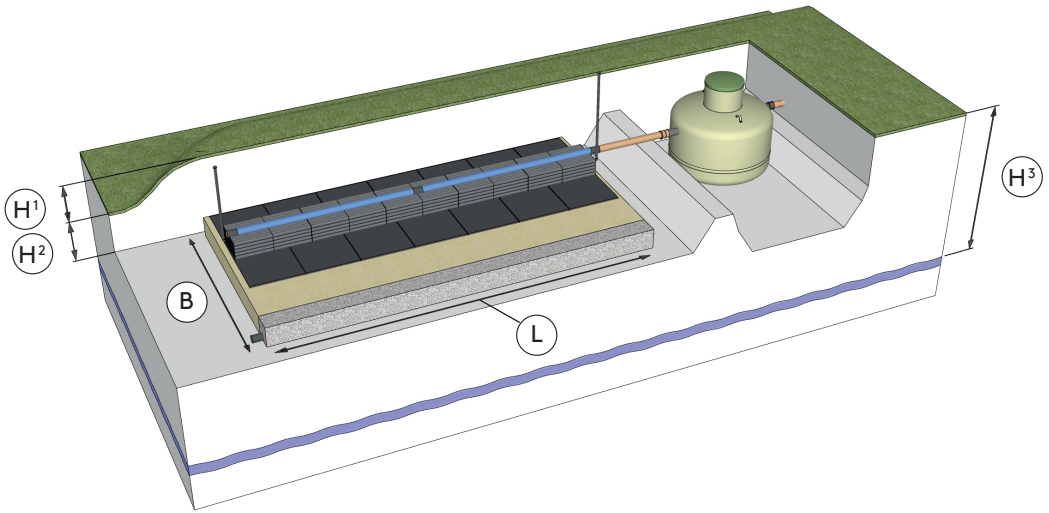

2023-03-27

BAGA BDT - horisontell markbädd - BDT 1-6 hh

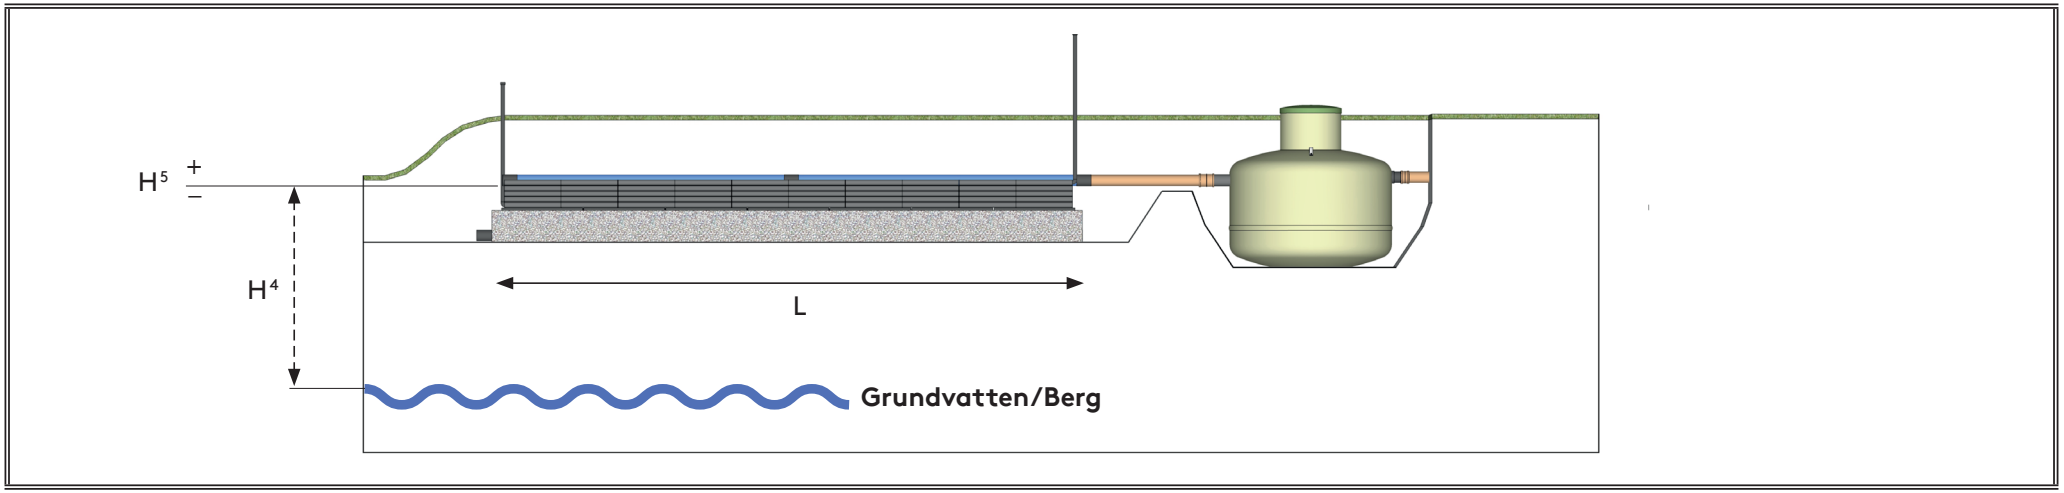


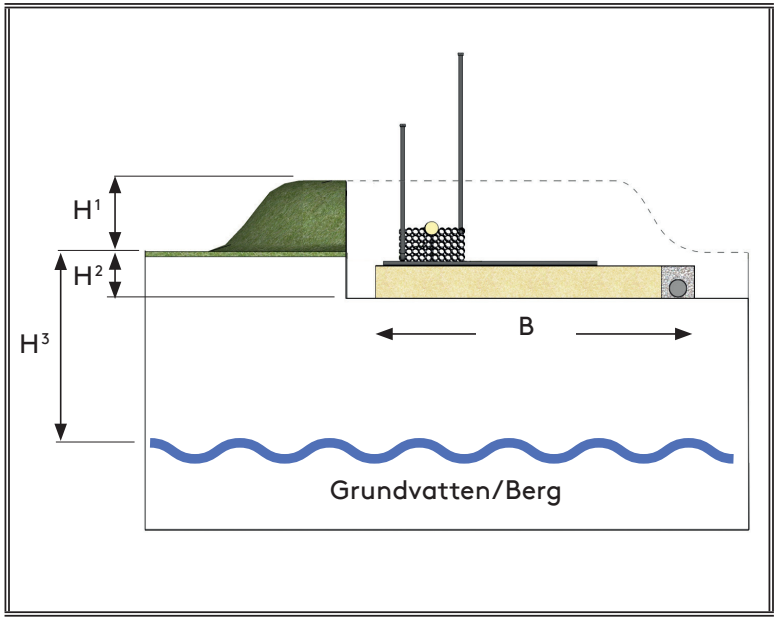

Grundvatten ☐ Berg ☐		
Grundvattennivå kontrollerad med:	Provgrop ☐ Grundvattenrör ☐ Annan metod:	
Grundvattennivå uppmätt till:	>2,5 m ☐ Annat värde:	Mätdatum:

Mått	Värde
L = Bäddens totala längd	
B = Bäddens totala bredd	
H^1 = Total höjd över befintlig markyta:	
H^2 = Avstånd från befintlig markyta till bäddens schaktbotten:	
H^3 = Avstånd från befintlig markyta till beräknad högsta grundvattennivå eller berg:	
H^4 = Avstånd från spridarrörets underkant till beräknad högsta grundvattennivå.	
H^5 = Spridarrörets avstånd och placering i förhållande till befintlig markyta.	+ ○ – ○

Avskärande dränering

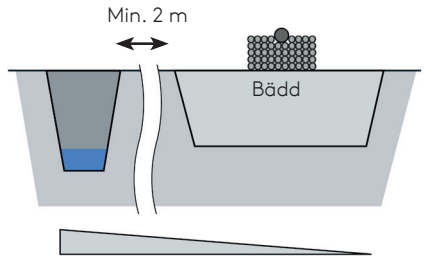

Kingspan BAGA
Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
www.kingspan.se/baga
